



FALKENBERG

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde
med kommunstyrelsen i Falkenberg

2016-05-03

§ 149

Slutredovisning av investeringsprojekt - "Svarta listan". KF (AU § 123) KS 2016-155

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1 Anteckna slutredovisning av investeringsprojektet *Svarta listan* till protokollet.

Beslutsunderlag

Tekniska nämnden § 16, 2016-03-16

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsavdelningen har i kommunala fastigheter genomfört en konvertering från olja till förnybar energi, såsom pellets, fjärrvärme etcetera.

Ekonomi

Projektets budget var 5 000 tkr och totalt utfall är 4 814 tkr. Projektet redovisar ett överskott på 186 tkr på grund av att Boverket betalade ut stöd för investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor i lokaler som används i offentlig verksamhet.

Övervägande

För slutredovisning av större investeringsprojekt gäller att investeringsprojekt med total utgift överstigande 5 mkr snarast efter färdigställande ska slutredovisas till kommunfullmäktige av den nämnd som disponerar anslaget.

Vid protokollet

Johan Ahlberg

Protokollet justerat 2016-05-04 och anslaget 2016-05-06.

Utdragsbestyrkande



FALKENBERG

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
tekniska nämnden i Falkenberg

2016-03-16

§ 16

Slutredovisning, "Svarta listan"

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta

- 1 Godkänna slutredovisningen samt överlämna till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Slutredovisning 2016-01-21.

Sammanfattning av ärendet

Stadsbyggnadskontoret har genomfört en avveckling av olja i kommunala fastigheter till annan värmekälla såsom pellets, fjärrvärme etc.

Ekonomi

Projektet redovisar ett överskott på 186 tkr p.g.a. att Boverket betalade ut stöd för investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor i lokaler som används i offentlig verksamhet.

(Bilaga TKN § 16/16)

Utdragsbestyrkande

Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelsen



2016-02-01

FALKENBERG

Kommunledningskontoret

Hans-Erik Wortmann, Stadsbyggnadskontoret.

SLUTREDOVISNING "Svarta Listan"

Bygg- och Projektavdelningen har genomfört en avveckling av olja i kommunala fastigheter till annan värmekälla så som pellets, fjärrvärme etc. Projektet pågick från 2006-2013. Härmed slutredovisas projektet.

Fastighet:	Kommunala byggnader
Arbetet påbörjat:	2006
Arbetet avslutat:	2013
Kostnadsredovisning:	Se bilaga
Projektör:	Stadsbyggnadskontoret, Hans-Erik Wortmann CREACON HKAB ÅF infrastruktur AB
Entreprenörer:	Falkenbergs Rör AB Falkenbergs Värmeteknik AB PEAB Sverige AB Systeminstallation AB
Konto:	Projekt 91199

Falkenberg 2016-02-01
Stadsbyggnadskontoret

Hans-Erik Wortmann
Projektledare

Kostnadsredovisning se bifogad bilaga

Kostnadsredovisning

2016-02-01

Budget **5 000 000**


Projektering	307 165
Byggherrekostnader	48 383
Entreprenadkostnader	5 708 128
Övriga kostnader	43 108
Summa:	6 106 784

Bidrag från Boverket **- 1 292 765**Avräknas mot budget 4 814 019**Överskott** **185 981****Kommentar:**

I projektet utbetalades stöd från Boverket för investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor i lokaler som används i offentlig verksamhet.

”SVARTA LISTAN”

Konvertering från olja till förnybar energi

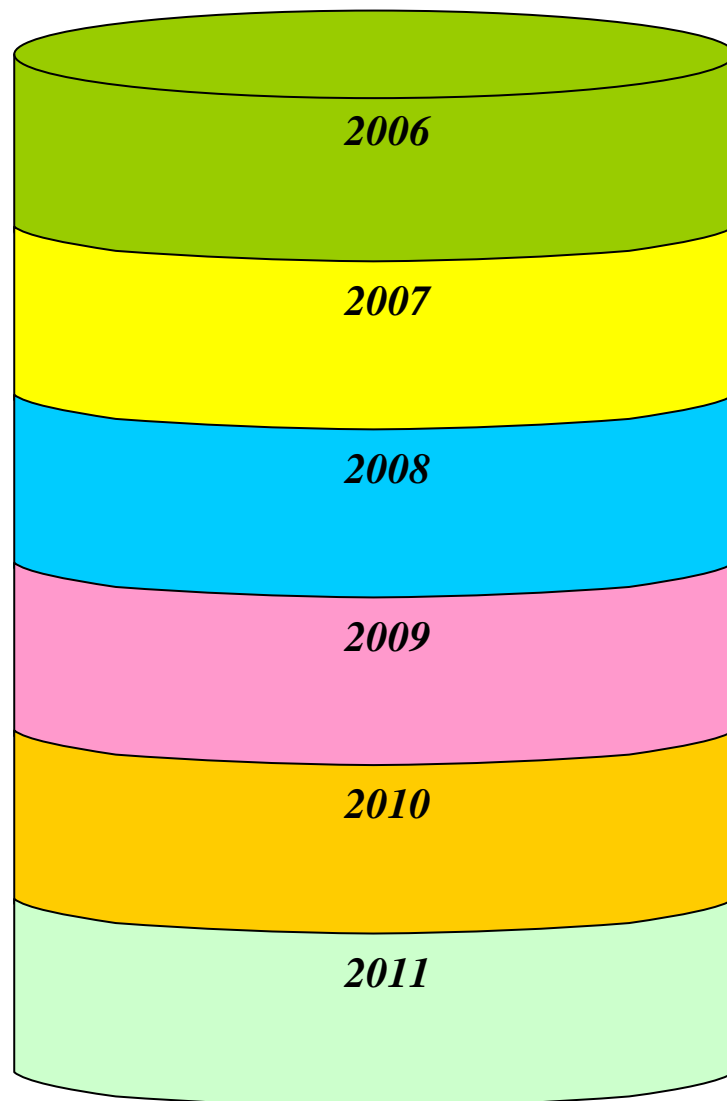

Vessigebroskolan inkl förskola o IH, Årstadskolan, Älvseredsskolan, Apelskolan, Gula Villan Gymnasieskolan

Morups IH, Vinbergsskolan, St Lars Kyrkogatan 8

Okomeskolan, Okome ga skola, Ljungby förskola

Gruppobstad Ljungby

Ljungbyskolan, Fageredsskolan, Långavekaskolan

Nya Museét, Hjortsbergs ga skola, Saneringsfastigheter
